PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

MAIRIE DE VILLEQUIERS

RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE DE VILLEQUIERS (18800)

agaura

Atelier GAUCHERY•RADIGUE

Villequiers

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Noms ressources
1	Préparation de chantier	22 jours	Ven 03/04/15	Lun 04/05/15	TCE
2	Clôtures / Installation de chantier	2 jours	Lun 04/05/15	Mar 05/05/15	LOT - 2 GO
3	Dépose et branchements de chantier	2 jours	Mer 06/05/15	Jeu 07/05/15	LOT -11 ELEC
4	Désamiantage Zone 1	8 jours	Lun 31/08/15	Mer 09/09/15	LOT - 1 Désamiantage
5	Contrôle du désamiantage	1 jour?	Jeu 10/09/15	Jeu 10/09/15	MO
6	Dépose de l'escalier et création de l'accès à l'étage	1 jour?	Ven 11/09/15	Ven 11/09/15	LOT - 2 GO
7	Désamiantage Zone 2	9 jours	Lun 14/09/15	Jeu 24/09/15	LOT - 1 Désamiantage
8	Contrôle du désamiantage	1 jour?	Ven 25/09/15	Ven 25/09/15	MO
9	Démolitions et dépose	11 jours	Lun 30/11/15	Lun 14/12/15	LOT - 2 GO
10	Percement et modification de baie	12 jours	Mar 15/12/15	Mer 13/01/16	LOT - 2 GO
11	Travaux de maçonnerie (Allège, seuils)	3 jours	Jeu 14/01/16	Lun 18/01/16	LOT - 2 GO
12	Réseaux intérieurs	2 jours	Mar 19/01/16	Mer 20/01/16	LOT - 2 GO
13	Chape flottante isolation thermique sous chape	4 jours	Jeu 21/01/16	Mar 26/01/16	LOT - 2 GO
14	Réseaux de chauffage	8 jours	Jeu 21/01/16	Lun 01/02/16	LOT - 9 CVC
15	Paliers de sorties	4 jours	Mer 27/01/16	Lun 01/02/16	LOT - 2 GO
16	Appro. des portes et fenêtres	35 jours	Lun 21/09/15	Ven 06/11/15	LOT - 3 ME EXT
17	Pose des portes et fenêtres	10 jours	Mer 27/01/16	Mar 09/02/16	LOT - 3 ME EXT
18	Appro. de l'ensemble de la menuiserie de l'entrée	35 jours	Mar 19/01/16	Lun 07/03/16	LOT - 3 ME EXT
19	Pose de l'ensemble de la menuiserie de l'entrée	2 jours	Mar 08/03/16	Mer 09/03/16	LOT - 3 ME EXT
20	Ossature bois	2 jours	Jeu 14/01/16	Ven 15/01/16	LOT - 3 ME EXT
21	Bardage intérieur & extérieur	6 jours	Jeu 10/03/16	Jeu 17/03/16	LOT - 3 ME EXT
22	Doublage	5 jours	Mer 10/02/16	Mar 16/02/16	LOT - 5 CLOISON
23	Finition doublage	2 jours	Jeu 10/03/16	Ven 11/03/16	LOT - 5 CLOISON
24	Plafond CF Isolation	5 jours	Mer 17/02/16	Mar 23/02/16	LOT - 5 CLOISON
25	Cloisons	5 jours	Mer 24/02/16	Mar 01/03/16	LOT - 5 CLOISON
26	Réseaux de plomberie	2 jours	Lun 29/02/16	Mar 01/03/16	LOT - 10 PLOMB - SANIT
27	Câblage électrique	10 jours	Mer 10/02/16	Mar 23/02/16	LOT -11 ELEC
28	Ventillation	5 jours	Mer 02/03/16	Mar 08/03/16	LOT - 9 CVC
29	Faux Plafond	7 jours	Mer 02/03/16	Jeu 10/03/16	LOT - 6 PLAFOND
30	Peinture	15 jours	Ven 11/03/16	Jeu 31/03/16	LOT - 8 PEINTURE
31	Travaux sur couverture	4 jours	Mer 09/03/16	Lun 14/03/16	LOT - 2 GO
32	Pose appareillage et armoire électrique	5 jours	Ven 01/04/16	Jeu 07/04/16	LOT -11 ELEC
33	Pose des luminaires	5 jours	Ven 08/04/16	Jeu 14/04/16	LOT -11 ELEC
34	Pose des radiateurs	5 jours	Ven 01/04/16	Jeu 07/04/16	LOT - 9 CVC
35	Pompe à chaleur	3 jours	Ven 08/04/16	Mar 12/04/16	LOT - 9 CVC
36	Essais & Mises en service	3 jours	Mer 13/04/16	Ven 15/04/16	LOT - 9 CVC
37	Sanitaires	15 jours	Ven 11/03/16	Jeu 31/03/16	LOT - 10 PLOMB - SANIT
38	Comptoir menuisé & habillage divers	2 jours	Mer 13/04/16	Ven 15/04/16	LOT - 4 ME INT
39	Revêtement de sol et Faïence	10 jours	Ven 15/04/16	Jeu 28/04/16	LOT - 7 SOLS
40	Reprise d'enduits extérieurs	2 jours	Ven 15/04/16	Lun 18/04/16	LOT - 2 GO
41	Reprises sur façades	3 jours	Mar 19/04/16	Jeu 21/04/16	LOT - 2 GO
42	Ravalement des façades	6 jours	Ven 22/04/16	Ven 29/04/16	LOT - 8 PEINTURE
43	Reception des travaux	10 jours	Lun 02/05/16	Ven 13/05/16	TCE

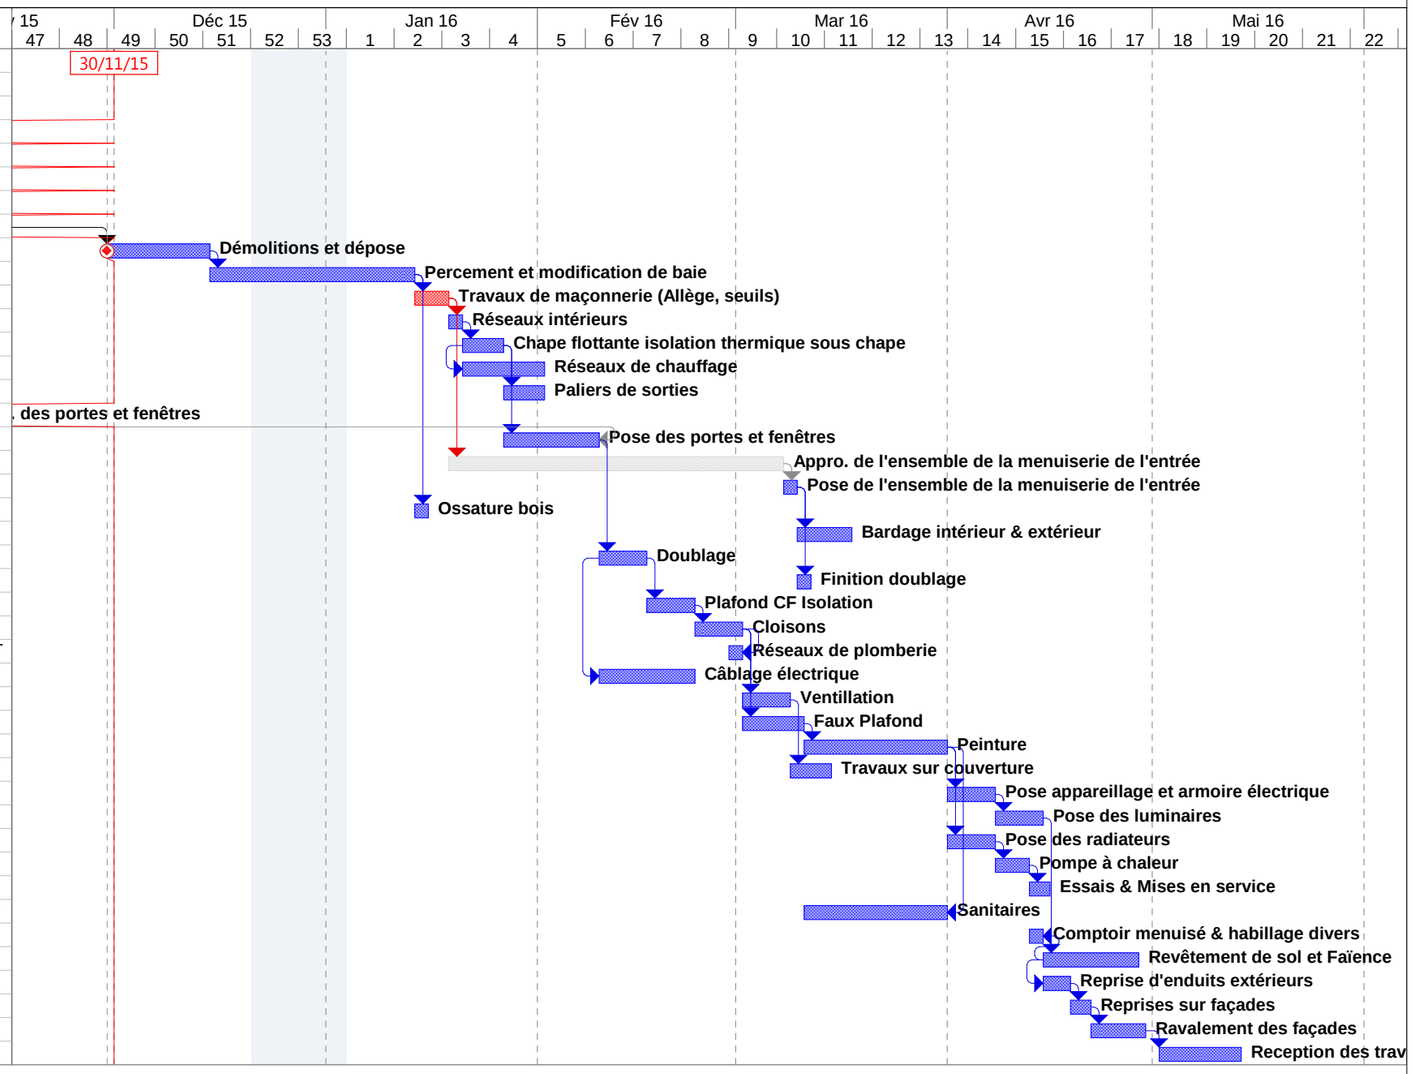

Projet : Planning chantier Villequiers
Date : Lun 30/11/15

Tâche	Récapitulative de projet	Récapitulatif inactif	Récapitulatif manuel	Jalons externes
Fractionnement	Tâches externes	Tâche manuelle	Début uniquement	Retard
Jalon	Jalons externes	Durée uniquement	Fin uniquement	Avancement
Récapitulative	Jalon inactif	Report récapitulatif manuel	Tâches externes	Échéance
